拓荒牛校园文创快闪试点活动策划案

轻工牧场

朱静涵 刘思雨 盛宏瑞 刘小平 汪婕

MARKETING PLANNING

目录

01. 项目概述 INTRODUCTION TO MARKETING PLAN

02. 范围界定 MARKETING PLAN PROCESS

03. 资源与进度统筹 PLAN BUDGET

04. 收尾与总结 EXPECTED TARGET PERFORMANCE

演示文稿是实用的工具，可以是演示，
演讲，报告部分时间，它们都是在为观众服务

CONTENTS

01

项目概述

PART ONE

项目概述



项目背景

- 校园IP文创需求上升
- 现有文创产品不足（质量、审美、文化表达）
- 拓荒牛作为校园精神代表，具有高认同度

试点目的

- 验证校园文创的真实需求
- 测试 IP 的传播力与接受度
- 探索是否具备规模化能力
- 小规模、低成本、可控风险的实验场景

活动形式

- 线下快闪售卖
- 售卖拓荒牛主题服饰
- 设置打卡点 + 简单互动
- 时长：1 - 2 天

02

范围界定

拓荒牛校园文创快闪售卖 · 线下短期试点项目

PART TWO

项目范围

本项目为拓荒牛IP校园文创快闪的试点活动，旨在验证校园文创的市场接受度，为后续规模化提供数据依据。

活动包含：

- **快闪摊位设计**、搭建与运营
- 文创服饰的设计、生产与定价
- **线下售卖流程的全链路执行**
- **引流活动**与拍照打卡点搭建
- 数据复盘与验收



产品运营

校园服饰系列

- 文化衫、卫衣、帽饰、Polo衫等

生活用品系列

- 定制水杯、帆布包、钥匙扣、文具等

礼品收藏系列

- 毕业纪念礼盒、限量版盲盒公仔、微缩建筑模型等

场地搭建

- 物料：展架 / 桌布 / 价目牌 / 背景板 / 提袋
- 区域：展示丨试穿丨收银丨拍照

库存管理

- S/M/L/XL 各尺码实时登记
- 售罄→现场更换提示牌
- 打包：袋子、贴纸、名片卡



行政与场地审批

场地申请

活动方案提交

电源与设备申请

现场安全合规确认

- 明确场地需求（≤5m²、人流量大）
- 向学院/社联提交摆摊申请
- 后勤进行现场可行性检查
- 预约活动时间
- 获得正式批复



行政与场地审批

场地申请 → **活动方案提交** → 电源与设备申请 → 现场安全合规确认



活动核心信息

目的

IP背景

预估参与人数

摊位布局草图



人员配置

5人团队角色

销售

宣传

收银

场控

备援



物料清单

文创服饰

展架

背景板

海报

收银设备



安全预案

人群管理方案

消防、电力、防护措施

意外情况处理流程

现场执行

预热海报

主题：拓荒牛 × 校园文化

发布渠道：抖音 / 朋友圈 / 小红书 / 校园墙

内容：时间、地点、IP形象亮点、限定款提示

校园社媒口碑传播

运营账号：官方社媒 / 团队成员私域

内容形式：打样开箱、试穿视频、幕后花絮

传播机制：话题 #轻工拓荒牛 #校园文创

活动当天引流机制

引流点设计：食堂外

手段：现场招牌、气球/手举牌、志愿者口播

触达路径：路过 → 关注 → 停留 → 试穿/拍照 → 购买

互动活动设置

“拍照即送贴纸”

“三人同行随机立减”

“限时 10 分钟福袋”

打卡点：拓荒牛背景板 + 校园话术手举牌

岗位分工

销售 x2：讲解款式、成交转化

引流 x1：维持氛围、吸引人流

拍照 x1：负责打卡点拍照、生成社媒内容

库存/收银 x1：库存登记、扫码支付

数据统计

- ◇ 销售数据
  - 总销量 / 各尺码销量占比
  - 高峰时段分析（上午/中午/傍晚）
  - 转化率（到场人数→购买）
- ◇ 活动热度
  - 打卡照片数量
  - 社交媒体曝光量
  - 互动人数（参与互动/拍照的人次）
- ◇ 用户偏好
  - 最热门颜色与尺码
  - 用户吐槽点与改进建议

演示文稿是实用的工具，可以是演示，
演讲，报告部分时间，它们都是在为观众服务

03

资源与进度统筹

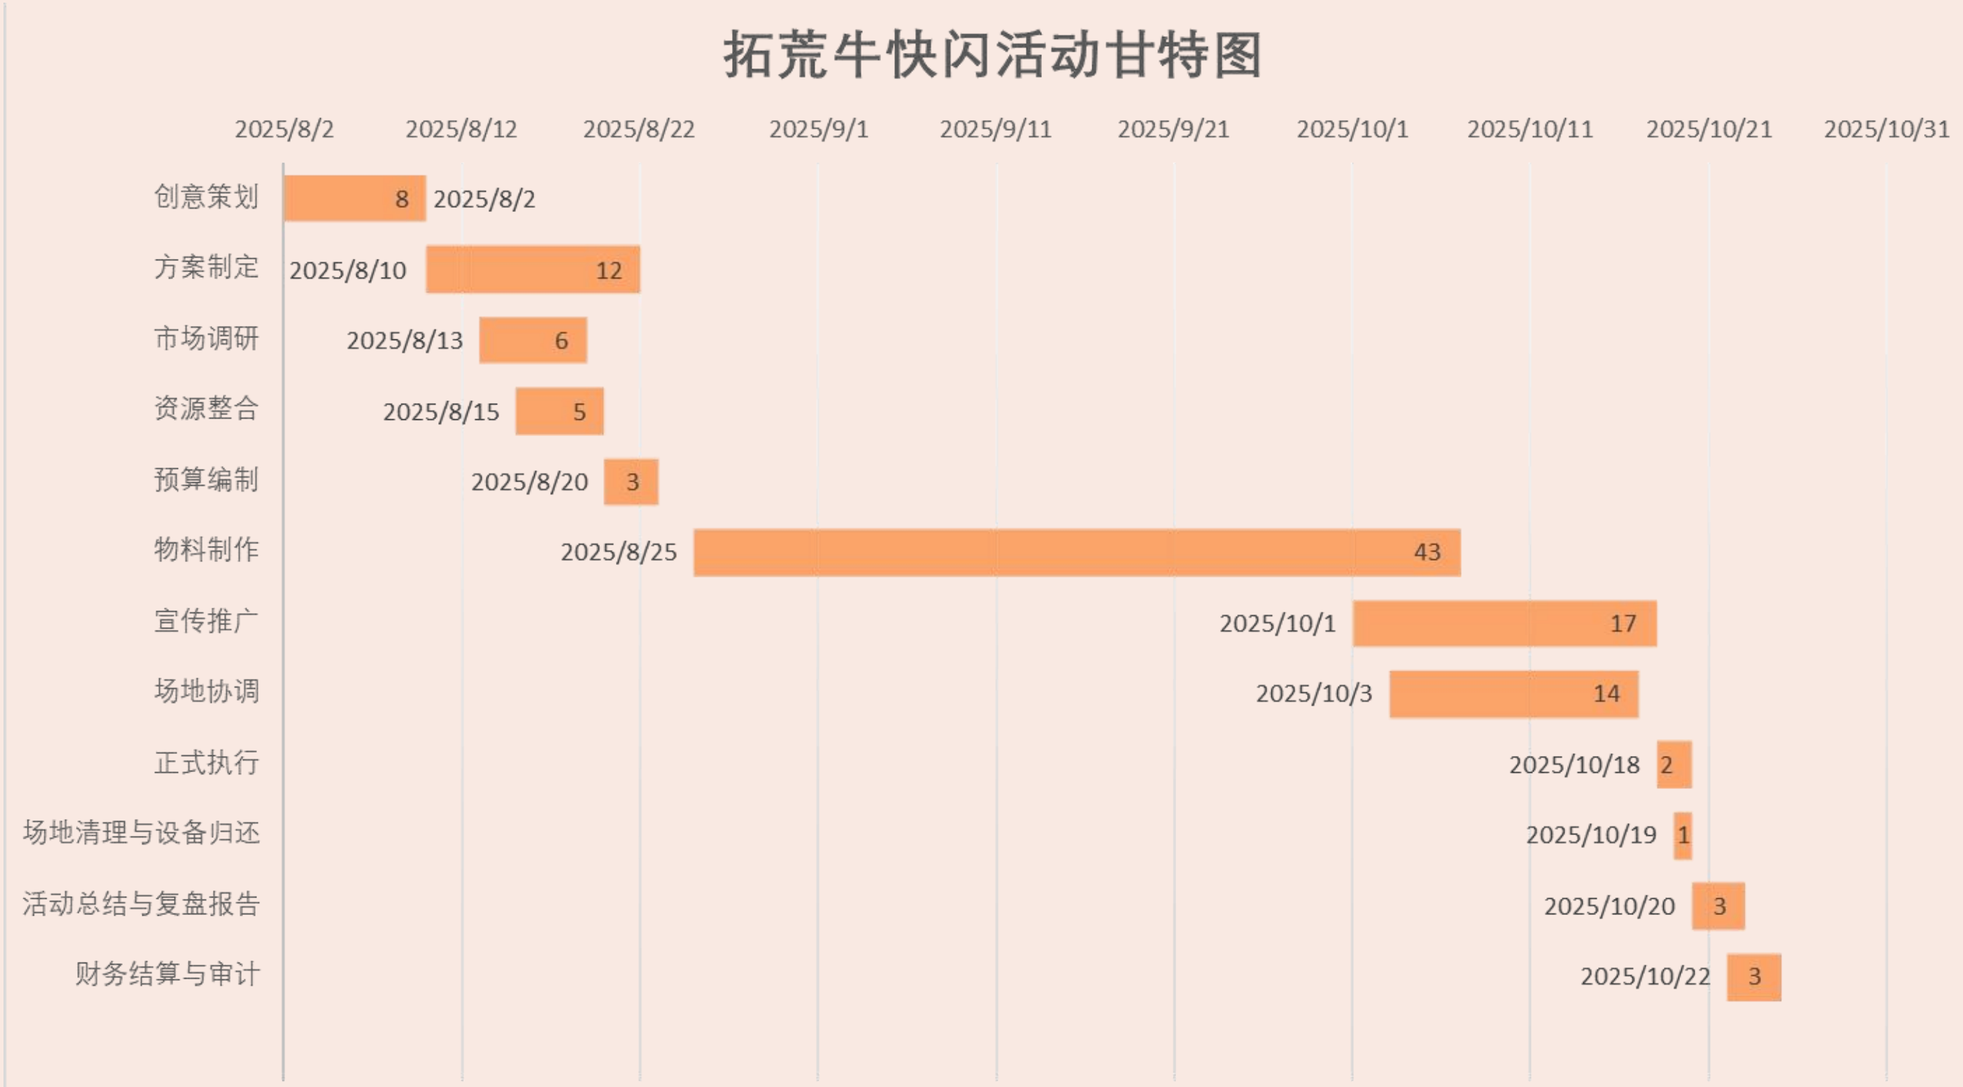
PART THREE

资源规划

RACI矩阵

阶段	总策划组	产品设计组	宣传推广组	运营销售组
1 活动筹备期				
确定活动目的	A	C	I	I
审批主题方案	A	R	C	I
制定预算	A	C	I	I
场地调研	R	I	I	I
报批材料准备	C	I	I	I
协议签订	R	I	I	I
2 物料制作期				
服饰/周边生产	C	A	I	I
宣传物料制作	I	I	A	I
打卡装置搭建	R	C	I	A
3 活动预热期				
线上活动执行	R	C	A	I
线下活动执行	C	I	A	I
预售开启	R	C	A	I
4 活动执行期				
现场销售管理	R	I	I	A
打卡点运营	C	I	R	A
实时补货/应急	I	I	I	C
现场秩序维护	R	I	I	C
5 活动收尾期				
物资回收	I	I	I	C
财务结算	A	I	I	I
复盘总结	A	C	C	C

进度管控


拓荒牛快闪活动甘特图
2025/8/2
2025/8/12
2025/8/22
2025/9/1
2025/9/11
2025/9/21
2025/10/1
2025/10/11
2025/10/21
2025/10/31
创意策划
8
2025/8/2
方案制定
2025/8/10
12
市场调研
2025/8/13
6
资源整合
2025/8/15
5
预算编制
2025/8/20
3
物料制作
2025/8/25
43
宣传推广
2025/10/1
17
场地协调
2025/10/3
14
正式执行
2025/10/18
2
场地清理与设备归还
2025/10/19
1
活动总结与复盘报告
2025/10/20
3
财务结算与审计
2025/10/22
3

风险分析



法律风险

使用学校校徽、校名易引发纠纷



运营风险

成本超支、库存滞销、供应链稳定



安全风险

现场拥挤踩踏、消防问题



天气突变

天气变化可能影响户外活动

风险提示：

线下活动难免遇到突发情况，现场的突发情况还可能造成舆论危机：投诉、社媒风波等

风险分析

法律风险

使用学校校徽、校名易引发纠纷

可能造成无法售卖的情况

应对策略

- 所有使用学校官方标识、图案的产品，均提前上报获取校方授权
- 设计方案归档，保证有源可溯

风险分析

运营风险

成本超支、库存滞销、供应链稳定

可能造成资金紧张、亏本、影响交付等问题

应对策略

- 预算统筹,支出透明化管理;按时复盘，预估超支环节并调整
- 小批量多批次生产，与供应商达成补货协议，控制成本同时保证库存压力较小

风险分析

安全风险与天气突变

现场拥挤踩踏、消防问题以及突发天气状况

可能造成资金紧张、亏本、影响交付等问题

应对策略

- 设计合理动线，预估并设计现场管理方式
- 现场安排工作人员维护秩序，备好消防设备
- 提前规划活动时间，同时设计备案，保证活动顺利进行

风险回避：

若突发状况无法控制/造成损失过大，在评估风险后可终止活动

04

收尾与总结

PART FOUR

验收标准



活动顺利执行无安全问题



收集不少于70份用户反馈

（问卷调查）



记录完整销售数据



获取IP接受度指标（如打卡量、互动量）

文案归档清单



活动策划书

校园拓荒牛文创周边快闪活动策划案大纲

一、活动核心信息

1. **活动名称**：拓荒传情·文创焕新——校园拓荒牛文创快闪试点活动
2. **活动主题**：传承拓荒精神，点亮校园文创
3. **活动目的**：1. 推广拓荒牛文创，提升师生认知度；2. 试点快闪模式，收集反馈积累经验；3. 强化校园文化认同；4. 提供网媒专业实践平台
4. **活动时间**：优选工作日午间（11:30-13:30）或周末（10:00-17:00），时长 1-2 天
5. **活动地点**：图书馆门前广场/食堂附近空地/校园文化活动中心入口（人流核心区）
6. **参与对象**：全体师生（核心：新生、文创爱好者、毕业季学生）
7. **组织架构**：主办/承办方明确；设策划组、推广组、物料组、执行组、后勤组、调研组，分工清晰

二、前期筹备

（一）文创筹备

1. 盘点文化衫、文具等核心品类，确定售卖清单、定价及学生专属优惠
2. 设计统一活动包装（含拓荒牛标识+校园 LOGO），预留展示样品

（二）宣传推广

1. 线上：设计海报、短视频等物料，通过校园官号、班级群等推广；发起话题互动、转发集赞赠礼
2. 线下：张贴海报、发放单页；联系校园广播提前 3 天预告

（三）场地与设备

1. 提前申请场地，规划展示区、售卖区等布局；筹备帐篷、展架等搭建物料
2. 准备音响、收款设备、打印机等；配备指示牌、防滑地垫等布置物料

（四）资金与应急

1. 制定详细预算，明确经费来源（实践经费/扶持资金/商家赞助）
2. 准备创可贴、备用电源等应急物资；制定人流疏导、天气突变等应急方案

三、活动执行

（一）现场搭建（活动前 1 天/当日早间）

1. 团队动员后搭建场地、陈列产品、调试设备；检查应急物资与场地卫生

（二）流程执行（活动当天）

1. 开场预热：播放音乐引导人流，实时线上发布现场动态
2. 核心环节：产品讲解售卖；开展故事分享、DIY 体验、拍照打卡、幸运抽奖等互动；同步收集师生反馈
3. 中场休整：轮换休息、清点库存、补充物资
4. 收尾阶段：发布收尾提示，统计参与数据，整理未售产品

（三）应急处理

1. 针对人流过多、天气突变、设备故障、产品缺货、纠纷等情况，执行对应应对方案

四、活动收尾

（一）现场清理与物资回收

1. 拆除搭建物料，清点收纳剩余文创与设备；清理场地恢复原貌

（二）数据统计与整理

1. 统计销售、参与、推广等数据；分类汇总师生反馈意见

（三）线上收尾推广

1. 发布活动回顾，回应师生反馈；预告后续文创推广计划

五、效果评估与后续规划

（一）效果评估

1. 评估目标完成度，分析师生反馈与团队执行问题，总结经验教训

（二）后续规划

1. 基于试点反馈优化文创品类与活动形式；规划二次快闪或线上售卖渠道



文案归档清单

预算与支出记录

校园拓荒牛文创快闪活动预算与支出表

支出类别	具体项目	单位	数量
场地与搭建物料	帐篷租赁	顶	2
	展架/陈列架	个	4
	桌布/装饰布	块	4
	指示牌/海报架	个	3
	防滑地垫/胶带	批	1
	场地申请手续费	次	1
宣传推广物料	海报设计与打印	张	10
	宣传单页	份	200
	线上推广素材（短视频/图文）	套	1
	校园广播/官号推广费	次	1
设备与工具	音响设备租赁	套	1
	备用电源/插排	个	2
	收款设备（POS/二维码牌）	套	2
	打印机租赁（可选）	台	1
互动与应急物资	互动礼品（小文创/贴纸）	份	50
	应急物资（创可贴/消毒棉/雨伞）	批	1
	DIY体验物料（可选）	份	30
其他费用	团队饮水/简易餐食	份	10
	备用金	元	1
总计			

1. 部分物料（如展架、电源）可通过借用校园社团/部门资源减免费用；
2. 互动体验、打印机租赁等项目为可选，可根据活动重点调整；
3. 实际支出栏需活动结束后逐笔核对填写，便于后续经费结算与效果复盘。

文案归档清单



销售数据表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
序号	文创品类	规格 / 型号	单价（元）	初始库存	销售数量	剩余库存	销售收入	折扣 / 优	实际收入（元）	销售时段		
1	文化衫	S/M/L/XL（拓荒牛印花款）	59					学生专属 9 折		活动第 1 天 / 第 2 天		
2	卫衣	S/M/L/XL（加绒款 / 薄款）	99/79					学生专属 8.5 折		活动第 1 天 / 第 2 天		
3	帽饰	棒球帽 / 鸭舌帽（拓荒牛刺绣款）	49					买 2 赠 1		活动第 1 天 / 第 2 天		
4	Polo 衫	S/M/L/XL（纯色印标款）	89					学生专属 9 折		活动第 1 天 / 第 2 天		
5	定制水杯	陶瓷款 / 不锈钢款（可刻字）	39/59					满 50 减 10		活动第 1 天 / 第 2 天		
6	帆布包	大号 / 小号（拓荒牛图案）	35/25					无额外优惠		活动第 1 天 / 第 2 天		
7	钥匙扣	金属材质 / 亚克力材质（拓荒牛造型）	29/19					买 3 赠 1		活动第 1 天 / 第 2 天		
8	文具	笔记本 / 中性笔 / 书签（单品 / 套装）	2025/8/15					满 30 减 5		活动第 1 天 / 第 2 天		
9	毕业纪念礼盒	含定制水杯 + 文具套装 + 纪念卡	129					毕业生专属 8 折		活动第 1 天 / 第 2 天		
10	限量版盲盒公仔	拓荒牛主题（单款 / 整套）	59/299					无额外优惠（限量稀缺）		活动第 1 天 / 第 2 天		
11	微缩建筑模型	校园标志性建筑（含拓荒牛元素）	159					学生专属 9 折		活动第 1 天 / 第 2 天		
	合计											

备注说明：

实际收入 = 销售收入 - 优惠金额，需根据具体折扣规则精准计算；

销售时段可细化为 “活动第 1 天午间”“活动第 2 天下午” 等，便于分析客流高峰销售情况；

备注栏可记录热销 / 滞销原因、客户反馈等信息，为后续文创推广提供参考；

初始库存需活动前精准盘点填写，剩余库存 = 初始库存 - 销售数量，每日活动结束后需核对更新。

文案归档清单



用户反馈问卷

校园拓荒牛文创快闪活动用户反馈问卷

尊敬的同学/老师：

您好！非常感谢您参与本次校园拓荒牛文创快闪活动。为进一步优化文创产品与活动体验，我们诚挚邀请您花费3-5分钟填写这份反馈问卷。您的每一条建议都对我们至关重要，所有信息将严格保密，仅用于活动总结与改进。感谢您的支持与配合！

一、基础信息（可多选/选填）

1. 您的身份是：☐ 本科生 ☐ 研究生 ☐ 教职工 ☐ 其他
2. 您是通过哪种渠道了解到本次活动的？☐ 校园海报 ☐ 班级/社团通知 ☐ 同学推荐 ☐ 社交媒体（微信/抖音等） ☐ 其他_____

二、活动体验评价（请在对应选项后打“√”）

1. 您对本次快闪活动的整体满意度：☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 非常不满意
2. 您对活动现场的布置与氛围：☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 非常不满意
3. 您对现场工作人员的服务态度与专业度：☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 非常不满意
4. 您对活动的组织流程（如动线、结算等）：☐ 非常顺畅 ☐ 比较顺畅 ☐ 一般 ☐ 不够顺畅 ☐ 非常混乱

三、文创产品评价

1. 您本次是否购买了文创产品？☐ 是 ☐ 否（跳转至第5题）
2. 您购买的文创品类（可多选）：☐ 拓荒牛玩偶 ☐ 钥匙扣 ☐ 笔记本 ☐ 书签 ☐ 帆布袋 ☐ 其他_____
3. 您选择购买该产品的主要原因（可多选）：☐ 设计新颖独特 ☐ 纪念意义浓厚 ☐ 实用性强 ☐ 价格合理 ☐ 其他_____
4. 您对所购产品的满意度：☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 非常不满意
5. 您最感兴趣但未购买的文创品类及原因：_____
6. 您认为现有文创产品存在的不足（可多选）：☐ 种类单一 ☐ 设计普通 ☐ 价格偏高 ☐ 质量一般 ☐ 实用性不足 ☐ 无 ☐ 其他_____
7. 您希望新增的文创品类（可多选）：☐ 服饰类（文化衫/卫衣等） ☐ 家居类（定制水杯等） ☐ 收藏类（盲盒公仔/微缩模型等） ☐ 礼盒类（毕业纪念礼盒等） ☐ 其他_____

四、改进建议与其他

1. 您认为本次活动在哪些方面需要改进？（如活动时间、地点、产品种类、优惠方式等）_____
2. 您希望未来校园文创活动以何种形式开展？（如主题展览、DIY体验、线上预售等）_____
3. 您对校园拓荒牛文创产品的价格定位有何建议？_____
4. 其他补充说明：_____

再次感谢您的宝贵反馈！祝您生活愉快！

填写日期：_____年_____月_____日

文案归档清单



复盘报告（含规模化评估）

校园拓荒牛文创快闪活动复盘报告（含规模化评估）

一、活动概况

本次校园拓荒牛文创快闪活动于[活动时间]在[活动地点]举办，为期2天，核心为拓荒牛主题文创展销，旨在验证校园文创市场接受度，积累经验以支撑后续规模化发展。

核心目标：1. 完成销售目标并测算转化率；2. 收集师生对产品及活动的反馈；3. 验证快闪模式可行性，为规模化提供数据支撑。

二、活动核心成果

（一）销售业绩表现

活动展出文创[X]类[X]件，实际销售[X]件，总销售额[X]元，达成目标[X]%。热销TOP3品类反映师生对实用纪念类文创需求较高，日均客流[X]人，购买转化率[X]%，优于校园同类活动均值。

（二）用户反馈情况

回收有效问卷[X]份显示：活动整体满意度[X]%，[X]%认可产品设计的校园特色，[X]%认可性价比；核心需求集中在新增服饰、收藏、礼盒类产品，及DIY体验、线上预售等活动形式。

（三）品牌传播效果

活动通过多渠道推广触达师生[X]人次，现场打卡引发自发传播，校园社交平台曝光量[X]次，有效提升拓荒牛文创品牌知名度，积累了初始用户基础。

三、活动存在的问题与不足

（一）产品层面

产品层面问题：1. 品类单一，缺乏高客单价收藏类产品，难以满足多元需求；2. 部分产品做工有瑕疵，[X]%受访者反馈影响体验；3. 库存管理精准度不足，热销品售罄、滞销品积压。

（二）活动组织层面

活动组织问题：1. 高峰期动线拥堵、结算低效，[X]%受访者反映等待久；2. 推广覆盖不足，[X]%受访者偶遇参与，前期客流少；3. 缺乏互动环节，用户停留时间短。

（三）团队协作层面

团队协作问题：现场分工不清，环节衔接不畅；突发情况（如库存不足）应对能力不足，影响服务效率。

四、规模化评估（核心模块）

（一）规模化可行性分析

规模化可行性：1. 市场支撑：[X]%受访者愿持续关注购买，师生群体稳定、文化认同强；2. 模式可复制：核心流程清晰、成本可控，适合多校区推广；3. 资源可整合：联动校内资源可降低成本；4. 政策利好：学校支持校园文化与双创工作。

（二）规模化推广目标

规模化目标：1. 范围：1年内覆盖全校区，每学期各校区办1-2次快闪，触达[X]人次；2. 产品：扩充至[X]类，形成完整产品矩阵；3. 业绩：单场销售额提升[X]%，年销破[X]元，复购率[X]%；4. 模式：构建“线下+线上+校企合作”常态化运营体系。

（三）规模化实施路径

实施路径：1. 产品升级：优先开发热门品类，建立品控标准，提供集体定制服务；2. 活动优化：制定标准化流程，构建“线上预热+线下落地+后期复盘”推广链路，增设互动环节；3. 资源整合：争取校内场地优惠，联动社团与商家拓展渠道；4. 数据搭建：建立销售与反馈跟踪体系，搭建用户社群提升粘性。

（四）规模化风险评估与应对

风险与应对：1. 市场风险：同类竞争加剧，需强化IP差异化，定期调研调整策略；2. 成本风险：规模化易推高成本，需优化供应链、整合校内资源、严控预算；3. 运营风险：多校区执行质量不均，需制定标准手册、开展培训并建立督导机制。

五、总结与下一步计划

本次活动达成预期目标，验证了市场可行性，但存在产品与组织层面不足。后续将重点推进产品矩阵升级、活动标准化、资源整合及数据体系搭建，推动拓荒牛文创成为校园特色文化IP，实现文化与商业价值双赢。

复盘人：[复盘人姓名/团队名称]

复盘日期：[复盘日期]

总结与预期

团体定制服务

针对班级、社团等提供专属LOGO、口号设计与产品定制。

活动策划与文创衍生

承接校园活动，提供主题创意、视觉设计与产品研发服务。

